SPRÁVA O REALIZÁCII PROJEKTU

Program: 1. Obnovme si svoj dom

Podprogram: 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok

Názov projektu: *Gréckokatolícky chrám v Čertižnom, ÚZPF č. 115/1 - Náter strechy a kovových konštrukcií.*

Číslo zmluvy: MK-4995/2019-423

Realizácia projektu prebehla v termíne od 7. do 22. septembra 2020, v rozmedzí 10-tich pracovných dní. Realizáciu sprevádzalo prevažne vyhovujúce počasie.

Stará a čiastočne zvetraná náterová vrstva bola odstránená za pomoci vysokotlakových vodných čističov (tzv. „vapka“) so silou 250 bar. Vodu bezodplatne poskytla obec Čertižné z vodovodnej prípojky na cintoríne, el. energiu poskytla farnosť Čertižné. Použitá bola priemyslová antikorózna farba na kov od českého výrobcu *Barvy a laky*, z produktovej rady Telkyd. Farebnosť bola podľa požiadaviek KPÚ Prešov prispôsobená farebnému odtieňu strešných plášťov. Vybrali sme odtieň RAL 3009 – „hrdzavá červená“. Príprava farby a jej riedenie riedidlom S6001 prebiehalo na zemi v stroji s kompresorom a priebežne bola tlakovaná hadicami nahor. Aplikovanie prebehlo v dvoch vrstvách pomocou striekacej vzduchovej pištole. Dostupné konštrukcie boli ošetrované z rebríka, ostatné na horolezeckom lane alebo s lanovým istením.

Obnova náteru strechy skrášlila národnú kultúrnu pamiatku. Životnosť náteru predpokladáme na 10 a viac rokov. Celkový objem finančných prostriedkov spotrebovaných na obnovu NKP predstavuje 11.042,52 €, kde pokrýva dotácia MK SR náklady vo výške 5.000,- €, spolufinancovanie z iných zdrojov predstavuje sumu 6.042,52 €. Prezentácia projektu je zabezpečená informačnou tabuľkou na priečelí chrámu pri hlavnom vchode, ktorá informuje verejnosť o skutočnosti finančnej podpory od Ministerstva kultúry SR. Podrobnejšie informácie o projekte sú sprístupnené pre verejnosť na internetových farských stránkach https://certizne.eu/prispevky/cirkevne-oznamy .

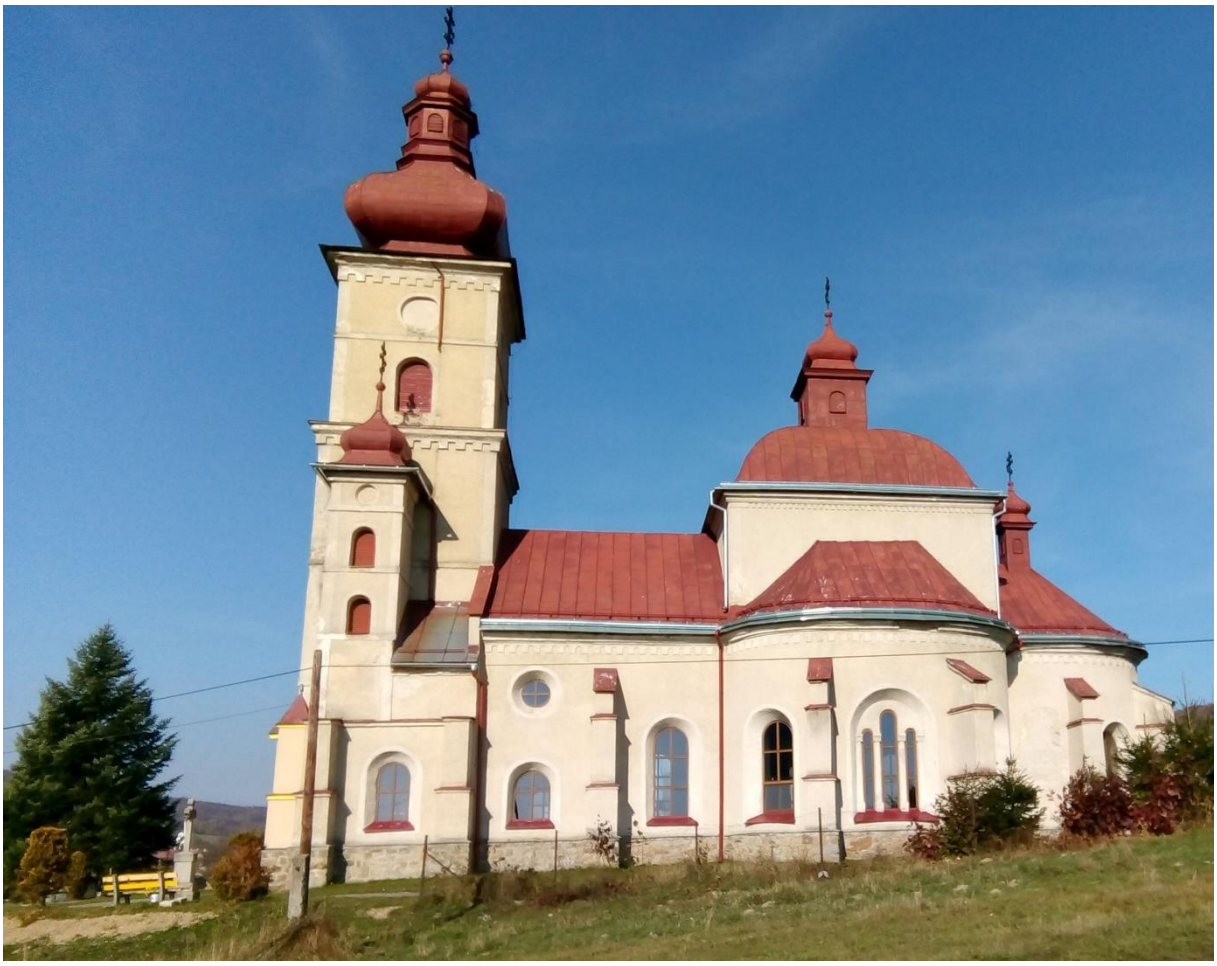

Obrázok 1 Južná strana: Pôvodný stav pred realizáciou projektu. Niektoré časti plechovej krytiny sú pôvodné, vyrobené pred 1. svetovou vojnou.

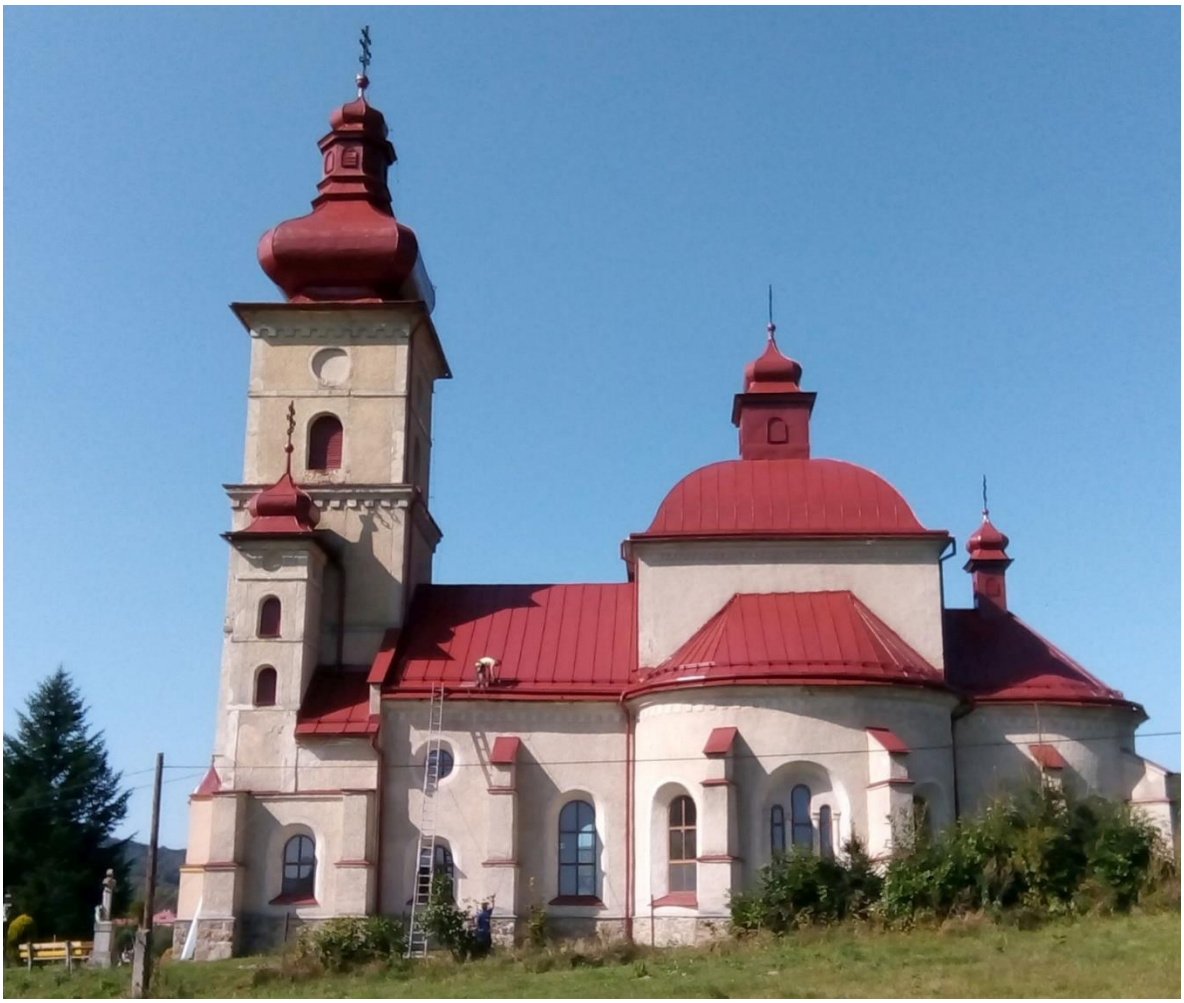

Obrázok 2 Južná strana: Takmer pred dokončením. Pracovný tím tvorili štyria pracovníci, dokončovacie práce zvládli v polovičnom počte.

Obrázok 3 Juhovýchodná strana veže: Najťažšou časťou projektu bolo natieranie strechy hlavnej veže. Laná bolo potrebné upevniť o najvyšší bod veže - kovový kríž vo výške asi 32m nad zemou.

Obrázok 4 Západná strana: pohľad od hlavného vchodu – okrem strechy sú nastriekané farbou aj dažďové žľaby, výplne okien, oplechovanie, parapety a ozdobné striešky.

Obrázok 5 Detail pri hlavnom vstupe: výrazne, ale nie rušivo, informuje tabuľa o finančnej podpore MK SR.
